

Empfehlungssystem wasserzisterne.de – Kickoff

Stakeholder: Christian Hein (Auftraggeber) · **Termin:** Dienstag, 23.06.2026 · **Team:** 2 Personen **Grundlage:** Projektplan Empfehlungssystem.md v1.1 (reviewed & ergebnisgesichert)

Dies ist der Projekt-Kickoff: Projektplan, Phasen, Milestones, KPIs, Risiken und die Entscheidungen, die wir für den Start brauchen. Das fachliche Konzept (Seiten, Flows, Design) ist aus Empfehlungssystem.pdf bekannt und nicht Gegenstand dieses Termins.

1 · Auftrag & Lieferversprechen

Ablösung von **TELLSCALE** (gekündigt) durch ein **eigenentwickeltes** Empfehlungssystem auf **eurem Hetzner-Server**, verzahnt mit eurem Bestand (KlickTipp, WooCommerce, sevDesk, n8n). Ziel-Domain: `empfehlung.wasserzisterne.de`.

Was wir liefern (Lieferumfang nach Priorität):

Prio	Lieferpaket
P0	Empfehlungs-Engine: NPS-Weiche · Link-/Token-System · Tracking · Attribution (Empfehlung→Kauf) · Consent/DSGVO · Gutschein-Versand · Branding-Basis
P1	Desktop-Pfad · Feedback-Flow · Admin-Panel (Promotoren, Status, Lookup, manuelle Zuordnung, Reward-Approval) · Interessenten-Fragebogen
P2	Admin-Dashboard mit Kennzahlen


Nicht im Umfang (bewusst entschieden): Template-Konfiguratoren · eigenes Mailsystem (KlickTipp übernimmt) · WhatsApp-Business-API (gelöst über `wa.me` -Multi-Share) · Bewertungsplattform-Integration · eigenes WP-Plugin.

2 · Vorgehen

backend-first → erst das verlässliche Fundament (Zuordnung, Gutschein-Sicherheit), dann die Oberflächen. Das Geschäftskritische steht zuerst sicher.

Qualität: Staging vor Produktion · CI/CD + automatisiertes Deploy · Tests auf dem kritischen
Steuerung: klare Schnitt-Verantwortung – App besitzt Daten/Logik, n8n besitzt alle Verbindungen zu Fremdsystemen, KlickTipp behält die Kampagnen-Hoheit

3 · Phasenplan & Timeline

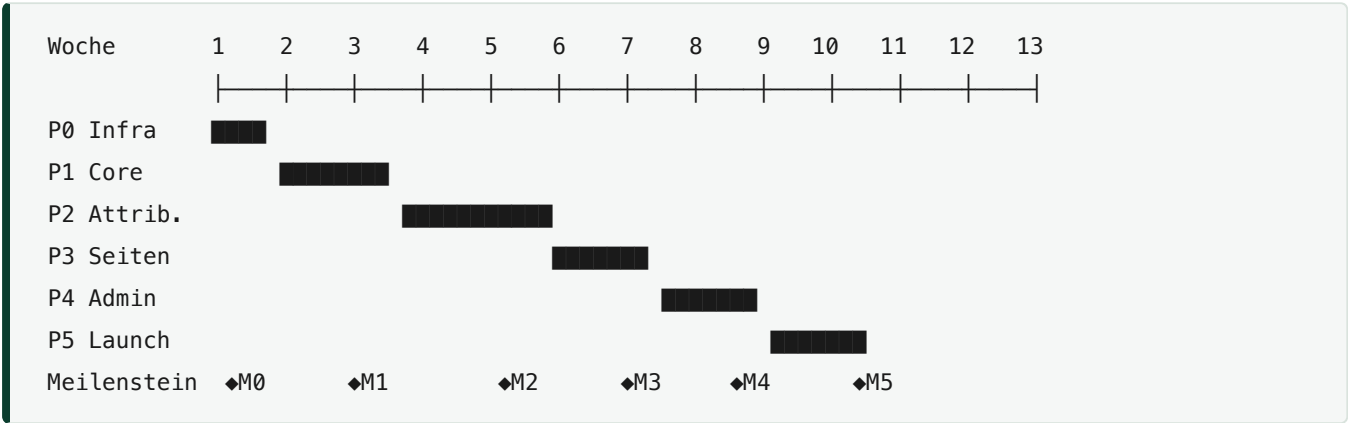

Phase	Inhalt
0 · Infrastruktur	Server, PostgreSQL, Reverse-Proxy/SSL, DNS, CI/CD + Staging, n8n/Secrets/Backup, Testzugänge
1 · Datenmodell + Core	Schema/Migrations, Token-/Short-Link + Redirect, Tracking, NPS-API, Promotor+Consent, QR, Branding-Basis
2 · Attribution + Reward	Lead-Capture, Order-Ingest, bidirektionales Matching, Mehrfach-Match-Guard, Reward-State-Machine, Gutschein-Mail
3 · Öffentliche Seiten	C1/D1 (mobil), E1 (Neukunde), C2/D2 (Desktop), Feedback, Fragebogen
4 · Admin-Panel	Auth+Audit, Promotoren CRUD/CSV, Referral-Status, Lookup, manuelle Zuordnung, Reward-Approval, Dashboard
5 · Integration & Launch	n8n-Flows final, E2E-Tests, Mobile/Cross-Browser, Go-Live + Monitoring

Dauer: ~10–14 Wochen (Richtwert; bei höherer Auslastung entsprechend früher). Detaillierte Aufwände führen wir intern und konkretisieren sie je Phase nach den Kickoff-Entscheidungen A1–A4.

4 · Milestones (mit Abnahmekriterium)

MS	Ergebnis	„Fertig“-Kriterium	Ziel
M0	Infrastruktur steht	Server/DB/CI/Staging laufen, DNS aktiv, Testzugänge da, A1–A4 entschieden	Wo. 1–2
M1	Fundament & Tracking	Ein Link wird erzeugt, geteilt und ein Klick sauber & doppel-sicher getrackt; NPS-Weiche live	Wo. 3–4
M2	Attribution & Reward (Herzstück)	Ein geworbener Kauf wird zugeordnet und löst genau eine 25-€-Auszahlung aus (Doppelzahlungs-Schutz, Approval)	Wo. 6–7
M3	Öffentliche Seiten live	Alle Kunden-Flows mobil und Desktop bedienbar (Empfehlen, Teilen, Neukunde, Feedback)	Wo. 8–9
M4	Admin-Panel	Team kann Promotoren, Empfehlungen, Status, Auszahlungen & Lookup verwalten	Wo. 10–11
M5	Go-Live	System produktiv auf <code>empfehlung.wasserzisterne.de</code> , E2E grün, Monitoring aktiv	Wo. 12–13

M2 ist der fachlich härteste und geldrelevante Meilenstein — wird vor Abnahme doppelt (adversarial) gegen die dokumentierten Fälle geprüft.

5 · KPIs / Erfolgsmessung

Produkt-/Business-KPIs (das Dashboard aus Phase 4 liefert sie automatisch):

Messgröße	Was sie zeigt	Zielwert
NPS-Promotor-Quote (Anteil 9–10)	Wie viele Kunden überhaupt empfehlen wollen	<i>KI-Vorschlag</i> ≥ 40 %
Promotor-Aktivierung (Mail → Link erstellt)	Greift die Kampagne?	<i>KI-Vorschlag</i> ≥ 15 %
Ø Empfänger pro Promotor	Multiplikator-Effekt (Kundenfokus)	<i>KI-Vorschlag</i> ≥ 3
Klickrate auf geteilte Links	Trägt der WhatsApp-Kanal?	<i>KI-Vorschlag</i> ≥ 25 %
Lead-Conversion auf E1 (Klick → Kontakt)	Funktioniert die Neukunden-Seite?	<i>KI-Vorschlag</i> ≥ 20 %
Empfehlungs-Conversion (Lead → Kauf)	Wirtschaftlicher Kern	<i>KI-Vorschlag</i> ≥ 5 %
Attribution-Match-Rate (auto vs. manuell)	Qualität der Zuordnung	<i>KI-Vorschlag</i> ≥ 70 % auto
Ausgezahlte Gutscheine / CAC	Kosten je geworbenem Kunden	im Kickoff festlegen

Die **Zielwerte sind KI-Vorschläge** zur Diskussion — sie stehen nicht im Plan und sind im Kickoff gemeinsam zu kalibrieren (Baseline TELLSCALE als Vergleich). Die Messgrößen selbst sind durch das System abgedeckt.

Projekt-/Liefer-KPIs: Phasen on-time · Testabdeckung Attribution/Reward $\geq 80\%$ · **0** Doppelzahlungen (Guard) · **0** offene kritische Bugs vor Go-Live.

6 · Top-Risiken & Umgang

Risiko	Umgang
Strukturelle Attribution-Verlustrate (Gastkauf, andere E-Mail, wa.me-Sprung)	Lead-Capture auf E1 maximiert harte Treffer; manuelle Zuordnung als Fallback; Restquote ist akzeptiert & transparent
Reward-Doppelzahlung (Mehrfach-Empfehlung)	Doppelte Idempotenz + Tie-Break + Approval-Gate (Geld nie 2x)
WooCommerce-Webhook liefert zu wenig Match-Felder	In Phase 0 testen (A2); manueller Fallback by-design
Streamendous-Workflow unklar	A4 vor Phase 2 klären; sauberer Fehler-/Neuversuch-Pfad modelliert
WhatsApp misst „versandt/an wen“ technisch nicht	Bewusste Grenze, ehrlich kommuniziert; gemessen werden Teilen-Klick + Link-Öffnung

7 · Kickoff-Entscheidungen (Gate für den Start)

Vier Punkte müssen entschieden sein, sonst bauen wir an einer Stelle ins Blaue. Für jeden gibt es einen **baubaren Default** — bestätigen oder anders entscheiden.

#	Entscheidung	Default (baubar)	benötigt vor	☐
A1	Promotor-Identität / Datenhoheit	Eigene DB, gespiegelt über KlickTipp-Abonnenten-ID	Phase 1	☐
A2	Kauf-Trigger + Match-Felder	Woo-Webhook; Match über E-Mail+Telefon (hart), Name (unscharf)	Phase 2	☐
A3	Gutschein-Bedingung	Fester Mindestbestellwert oder definierte Produktliste	Phase 2 & 3	☐
A4	Gutschein-Ausführung (Streamendous)	Backend prüft & triggert, Streamendous führt aus, Code per Mail	Phase 2	☐

Zu bestätigende Annahmen: WordPress nur verlinken (kein Plugin) · Match-Zeitfenster 90 Tage · Gutschein-Mail über KlickTipp.

Offener Punkt — Deploy-/Staging-Plattform: Ihr habt bereits **Coolify** auf dem Hetzner-Server (deckt Deploy, SSL/Reverse-Proxy und Staging, ggf. auch PostgreSQL ab). Im Kickoff zu klären: nutzen wir **Coolify** als Deploy-/Staging-Plattform (und testen direkt bei euch), oder setzen wir ein eigenes **GitLab-CI + Reverse-Proxy** auf? Die Entscheidung beeinflusst den Umfang von **Phase 0**.

8 · Rollen & Mitwirkung

Wer	Verantwortung
Entwicklungsteam (2)	Bau, Tests, Deployment, Doku — gemäß Phasenplan
n8n / KlickTipp	Integrations-Orchestrierung bzw. Kampagnen- & Mailversand (Bestand)
Auftraggeber (Christian Hein)	A1–A4 entscheiden · Zugänge bereitstellen · Branding & Video liefern · Abnahme je Milestone

Für den Start benötigte Zugänge: KlickTipp-API-Key · WooCommerce-Webhook · Streamendous-API/Doku · Branding (Logo SVG + Hex-Farben) · Vimeo-URL · etermin-Prefill-Doku · DNS-Freigabe.

9 · Nächste Schritte

1. A1–A4 entscheiden, Annahmen bestätigen, Zugänge anstoßen.
2. Phase 0 starten (DNS, Server, DB, CI/Staging) → **M0**.
3. Fundament & Attribution bauen — das Herzstück zuerst.

Mit den vier entschiedenen Punkten ist das Projekt **kickoffbereit** und startet ohne weitere Rückfragen.
